



ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN

LUGAR, HORA Y FECHA DE RECEPCIÓN

En la localidad: **Guanajuato**
 Del Municipio: **Guanajuato**
 Siendo: **11:00** hrs. **14** del día **de enero de 2026**
 Se reunieron en: **Los Filtrros, SIMAPAG, Carretera Guanajuato - Dolores Hidalgo Km. 5.5 Colonia Valenciana, de esta Ciudad de Guanajuato, Gto. C.P. 36240**

Objeto del acta: Entregar por parte del contratista y recibir por el Organismo Operador, de acuerdo con lo indicado en el programa de obra, los trabajos que ejecutó la contratista en la Rehabilitación de sistema de agua entubada en la zona de Presa de Mata, tramo de la Planta Salvador Yáñez Castro a Peñolera, de acuerdo al contrato SIMAPAG/OP/AD/FAISMUN/2025-02. La presente acta no exime al contratista de la obra de las deficiencias o vicios ocultos que resulten del mismo, y se obliga a su corrección sin costo alguno, para El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG).

Se realiza la presente acta de conformidad con el Art.110 y 114 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y Art. 244, 245 y 249 de su Reglamento.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Se realizó la rehabilitación de la línea de agua potable en la zona de la Presa de Mata, específicamente en el tramo desde la planta Salvador Yáñez Castro hasta Peñolera, la cual contempló la colocación de 1,117.16 ml de tubería de acero negro al carbón de 150 mm de diámetro, suministro e instalación de válvulas compuerta para seccionamiento y válvulas admisoras y expulsoras de aire.

Obra: **Rehabilitación de sistema de agua entubada en la zona de Presa de Mata, tramo de la Planta Salvador Yáñez Castro a Peñolera**

Municipio: **Guanajuato**

Núm de contrato: **SIMAPAG/OP/AD/FAISMUN/2025-02**

Monto contrato **\$3,798,291.36**

Núm de Convenio

Monto de ampliación: **\$0.00**

Total: **\$3,798,291.36**

Fecha de inicio según contrato: **1 de septiembre de 2025**

Terminación según contrato: **29 de noviembre de 2025**

Fecha de inicio real: **19 de septiembre de 2025**

Terminación real: **17 de diciembre de 2025**

Convenio Modificatorio en Tiempo: **SIMAPAG/OP/AD/FAISMUN/2025-02-1**

RELACION DE ESTIMACIONES

Monto contratado: **\$3,798,291.36**

IVA incluido

Anticipo: **\$1,139,487.41**

30%

	Nº	PERIODO:		PAGADO	C/IVA
Estimación	1	19-sep-25	26-sep-25	\$1,576,980.96	\$ 1,829,297.91
Estimación	2	27-sep-25	26-oct-25	\$870,366.73	\$ 1,009,625.41
Estimación	3	27-oct-25	25-nov-25	\$438,292.66	\$ 508,419.49
Estimación	4	26-nov-25	17-dic-25	\$388,748.75	\$ 450,948.55
				Subtotal	\$3,274,389.10
				Saldo	\$0.00
				Total	\$ 3,798,291.36

SANCCIONES

Nº	Periodo:	Pagado	Sanción



ACTA DE ENTREGA/RECEPCIÓN

DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN:

	SI	NO		SI	NO
Planos Actualizados (As built)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bitácora de Obra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Garantías a equipos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Otros (describir): _____					

Declaración de las artes que se entregan esos documentos :

EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

De conformidad con el Art.113 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y Art. 238 y Art. 243 de su Reglamento.

Ambas partes manifiestan que no existen adeudos ni reclamaciones que hacer, por lo tanto, se dan por extinguidas las obligaciones que genera este contrato, otorgando el mas amplio Finiquito que en su derecho proceda, respecto al presente contrato y de ser el caso de sus respectivos convenios.

Se firma la presente el día de su fecha, firmando al calce los que en ella intervinieron, sin perjuicio del derecho que este organismo operador pueda realizar para hacer valer las garantías de Vicios Ocultos y demás, derivadas de este contrato.

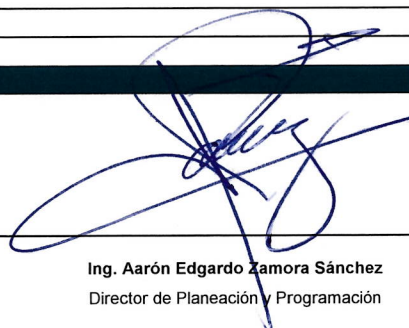
GARANTÍAS


Anticipo	Aseguradora ASERTA, S.A. de C.V.	N°.	1187-07653-8	Monto:	\$1,899,145.68
Cumplimiento	Aseguradora ASERTA, S.A. de C.V.	N°.	1187-07654-7	Monto:	\$379,829.14
Vicios Ocultos	Aseguradora ASERTA, S.A. de C.V.	N°.	1542-00036-7	Monto:	\$379,829.14
Otra garantía					

OBSERVACIONES

Obra terminada al 100%

POR LA


Ing. Aarón Edgardo Zamora Sánchez
 Director de Planeación y Programación


Ing. Juan Miguel Morales Morales
 Coordinación de Construcción



Ing. Adriana María Murillo Flores
 Supervisor SIMAPAG



MORAV Construcciones del Bajío, S.A. de C.V.
 Contratista
